



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA DE SOFTWARE

ZIGNA
Sprint 3 - Desarrollo

MAESTRA:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

EQUIPO:
Renata Monserrath Flores Ramirez
Valeria Garcia Fernadez
Dannia Lizeth Hernnadez Ortiz
Blanca Elizabeth Ruiz Esquivel
Leticia Paola Viesca Cortez

San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 23 de Abril del 2026

Índice

1. Roles.	4
2. Objetivo del Sprint - Desarrollo.	4
3. Planificación del Sprint.	5
4. Actividades realizadas por rol.	5
5. Avances del sistema.	6
6. Cumplimiento del Sprint.	6
7. Herramientas utilizadas.	6
8. Problemas encontrados.	7
9. Soluciones aplicadas.	7
10. Conclusión del Sprint.	7
11. Evidencias.	8
11.1. Interfaces	8
11.2. Trello.	12
11.3. GitHub	16
11.4. GitHub	16
11.5. Visual	17
11.6. XAMPP	17

Índice de figuras

1. Pantalla Registro.	8
2. Pantalla Inicio Sesión.	9
3. Pantalla Inicio.	9
4. Pantalla Módulo.	10
5. Pantalla Abecedario.	10
6. Pantalla Palabras.	10
7. Pantalla Frases Cotidianas.	11
8. Pantalla Evaluación.	11
9. Pantalla Progreso.	11
10. Creación de las tarjetas.	12
11. Avance 2026-03-24	12
12. Avance 2026-03-25	13
13. Avance 2026-03-26	13
14. Avance 2026-03-30	13

15.	Avance 2026-04-01	14
16.	Avance 2026-04-14	14
17.	Avance 2026-04-16	14
18.	Avance 2026-04-20	15
19.	Avance 2026-04-21	15
20.	Avance 2026-04-23	16
21.	GitHub-QA	16
22.	Visual-QA	17
23.	XAMPP-QA	17
24.	OneDrive	18

Ingeniería de Software

ZIGNA

23 de abril de 2026

Datos del proyecto

- **Equipo:** Chicas.
- **Nombre del proyecto:** ZIGNA.
- **Área del proyecto:** Social / Inclusivo.
- **Sprint:** 3.
- **Periodo:** 23 de Marzo al 23 de Abril.

1. Roles.

- Renata Monserrath Flores Ramirez – Dev Líder.
- Valeria Garcia Fernandez - Diseñador.
- Dannia Lizeth Hernandez Ortiz - Analista.
- Blanca Elizabeth Ruiz Esquivel - Coordinador.
- Leticia Paola Viesca Cortez - QA.

2. Objetivo del Sprint - Desarrollo.

Desarrollar una primera versión funcional del sistema de software que permita validar su correcto funcionamiento a través de un flujo básico de uso. Durante este sprint se busca integrar los principales componentes del sistema, de manera que el usuario pueda interactuar con la aplicación, navegar entre sus módulos y ejecutar las acciones principales. Asimismo, se pretende asegurar el manejo adecuado de la información, permitiendo el almacenamiento y consulta de datos, con el fin de comprobar que el sistema es viable, funcional y puede ser utilizado en un contexto real.

3. Planificación del Sprint.

Se definieron y organizaron las actividades del sprint mediante un tablero en Trello, asignando tareas según el rol de cada integrante. Se priorizó el desarrollo de las funcionalidades principales del sistema y la integración de sus componentes.

Debido a limitaciones de tiempo, se realizaron ajustes en la distribución de actividades para asegurar el cumplimiento del objetivo del sprint.

4. Actividades realizadas por rol.

Durante el sprint, las actividades se distribuyeron de acuerdo con los roles del equipo. Todos los integrantes trabajaron en sus respectivas ramas de GitHub y participaron en la elaboración del video del proyecto.

■ Dev Líder:

- Definición de la estructura y modularización del sistema.
- Creación de la rama "desarrollo".
- Creación de la base de datos.
- Gestión de cambios en GitHub.
- Apoyo en la creación de imágenes.

■ Diseñador:

- Desarrollo inicial de interfaces (inicio de sesión, inicio y registro).
- Entrega parcial de pantallas que requirieron ajustes posteriores.

■ QA:

- Revisión general del sistema.
- Corrección y finalización de interfaces.
- Implementación de la conexión con la base de datos.
- Elaboración del reporte de pruebas.
- Registro de avances mediante commits.

■ Analista:

- Elaboración de criterios de aceptación.
- Validación de requerimientos.

■ Coordinador:

- Organización de tareas en Trello.
- Seguimiento del sprint.
- Reasignación de actividades.
- Apoyo en creación de imágenes.

5. Avances del sistema.

Durante el sprint se desarrollaron las interfaces principales del sistema (inicio de sesión, registro e inicio), las cuales fueron ajustadas para su correcto funcionamiento y a su vez se realizaron pantallas faltantes (módulos, contenido en cada módulo y progreso). Se implementó la evaluación con retroalimentación, aunque el sistema no quedó al 100 debido a que faltó cambiar las respuestas de las evaluaciones. Asimismo, se logró la conexión con la base de datos para almacenar resultados y progreso, sin embargo, la pantalla de progreso no se terminó y no muestra la información correspondiente.

6. Cumplimiento del Sprint.

El sprint tuvo una duración de tres semanas, durante las cuales se presentaron diversas situaciones que afectaron el avance del proyecto.

En la primera semana, el progreso fue limitado debido a que algunas actividades clave no se completaron en tiempo, principalmente la definición de criterios por parte del área de análisis. Esto generó un retraso en actividades dependientes, como el diseño del flujo principal del sistema, la elaboración del README y el desarrollo de las interfaces, afectando el avance general.

Posteriormente, el sprint coincidió con el periodo vacacional de Semana Santa. Durante este tiempo, se intentó avanzar mediante la organización entre algunos integrantes; sin embargo, debido a la disponibilidad y ajustes en las actividades personales, no se logró el avance esperado. En la segunda semana de vacaciones se optó por no intervenir para respetar los tiempos del equipo.

Al retomar actividades, correspondiente a la segunda semana efectiva del sprint, continuaron algunos retrasos en el área de diseño, lo que impactó en la integración de la conexión a la base de datos y en las pruebas del sistema.

Finalmente, en la tercera semana, y con el objetivo de cumplir con la entrega, se tomó la decisión de reorganizar y reasignar tareas entre los integrantes, lo que permitió completar las funcionalidades principales en el tiempo restante. Debido a las limitantes de tiempo y que se acercó la fecha de entrega, el sistema presenta pendientes técnicos en la lógica de respuestas de evaluación y en la visualización de la pantalla de progreso.

7. Herramientas utilizadas.

- **GitHub:** Control de versiones y gestión de cambios.
- **Trello:** Organización de tareas.
- **HTML, CSS y JavaScript:** Desarrollo de interfaces.
- **PHP:** Lógica del sistema.
- **MySQL:** Almacenamiento de datos.
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo utilizado para la programación y ejecución del sistema.

8. Problemas encontrados.

- Retraso en el desarrollo de interfaces.
- Limitaciones de tiempo por periodo vacacional.
- Dependencia entre actividades.
- Dificultad en el uso de GitHub.
- Necesidad de reorganización del equipo.
- El sistema no quedó al 100, faltó cambiar respuestas de las evaluaciones.
- Pantalla de progreso inconclusa, no muestra los datos que debe mostrar.
- Dificultad en el uso de GitHub.

9. Soluciones aplicadas.

- Reorganización de tareas.
- Apoyo entre roles.
- Enfoque en funcionalidades prioritarias.
- Uso de ramas y commits en GitHub.
- Aprendizaje guiado del uso de herramientas.

10. Conclusión del Sprint.

El sprint permitió avanzar en el desarrollo del sistema, logrando una versión funcional con las principales características implementadas.

Aún con las dificultades relacionadas con el tiempo, organización y uso de herramientas, el equipo logró adaptarse mediante la reorganización de tareas y el trabajo colaborativo.

A pesar de que el sistema no se completó en su totalidad específicamente en el cambio de respuestas y la visualización de progreso, el equipo logró adaptarse y obtener una base sólida para futuras mejoras

11. Evidencias.

11.1. Interfaces



Crea tu cuenta

Regístrate para guardar tu progreso.

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Correo Electrónico

Contraseña

Crear Cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Figura 1: Pantalla Registro.



Bienvenido de nuevo

Correo Electrónico

Contraseña

 [Ver](#)

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Figura 2: Pantalla Inicio Sesión.

 Inicio Módulos Progreso Cerrar sesión 

Sigue el aprendizaje en ZIGNA

Aprende Lengua de Señas Mexicana y mejora tu comunicación.



A

El Abecedario

Aprende cada letra para deletrear palabras.

[▶ Seguir aprendiendo](#)



P

Palabras Clave

Aprende palabras básicas del día a día.

[▶ Seguir aprendiendo](#)



F

Frases Cotidianas

Aprende a comunicarte con frases completas.

[▶ Seguir aprendiendo](#)

Figura 3: Pantalla Inicio.

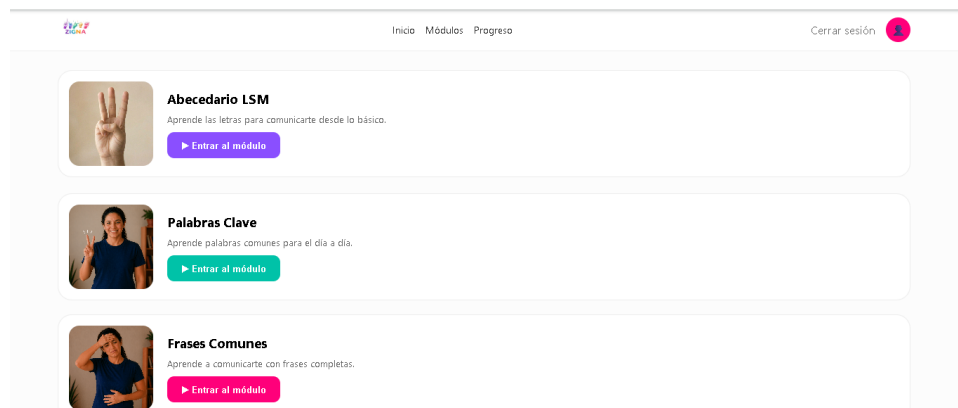


Figura 4: Pantalla Módulo.

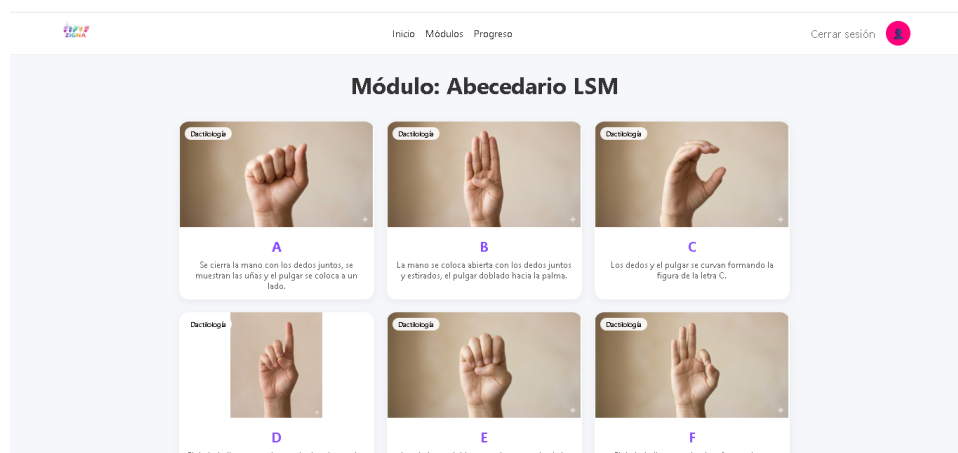


Figura 5: Pantalla Abecedario.

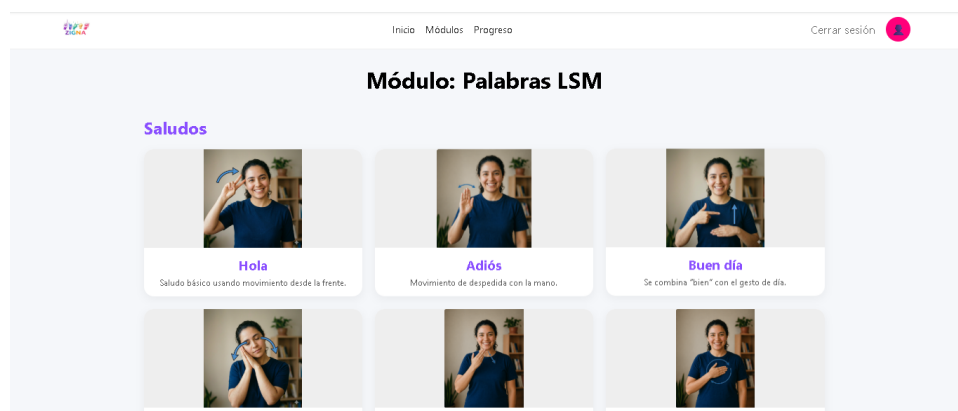


Figura 6: Pantalla Palabras.

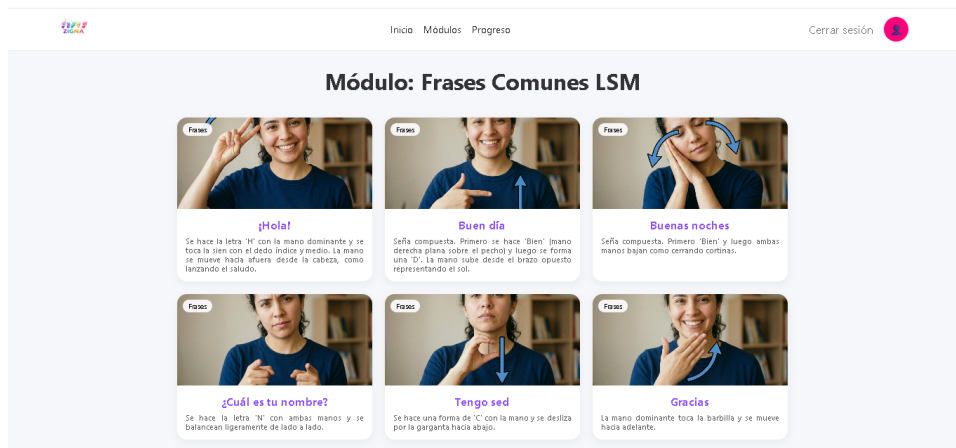


Figura 7: Pantalla Frases Cotidianas.

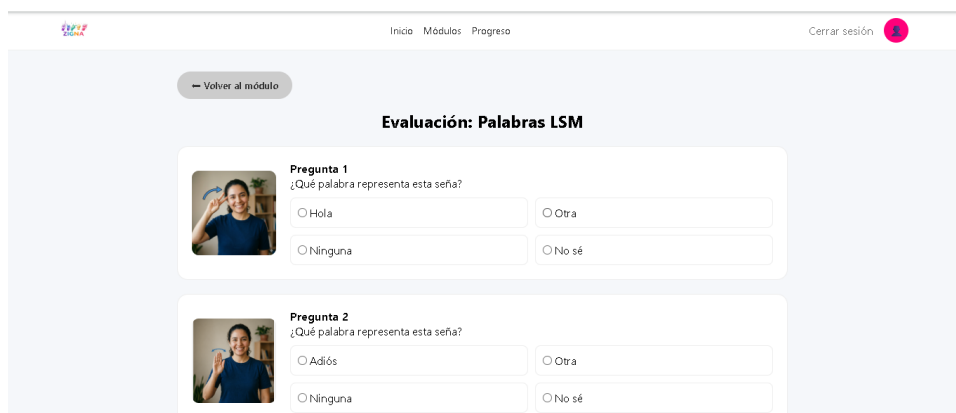


Figura 8: Pantalla Evaluación.



Figura 9: Pantalla Progreso.

11.2. Trello.

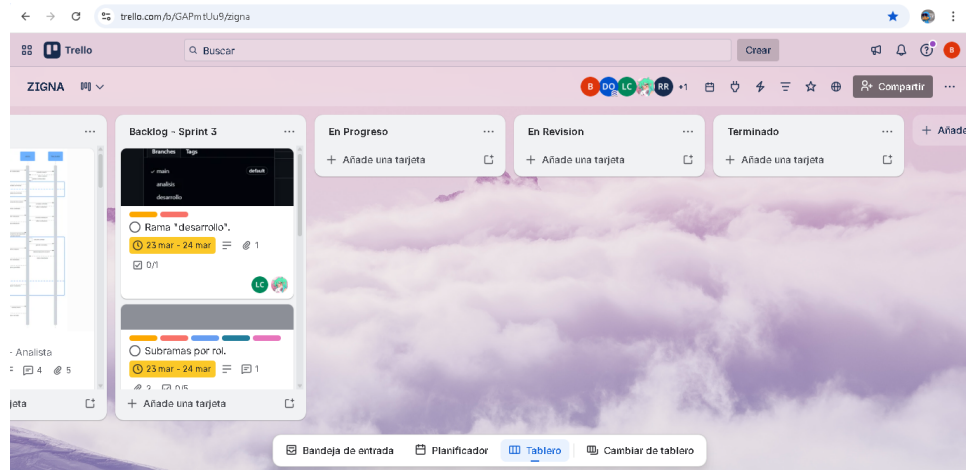


Figura 10: Creación de las tarjetas.

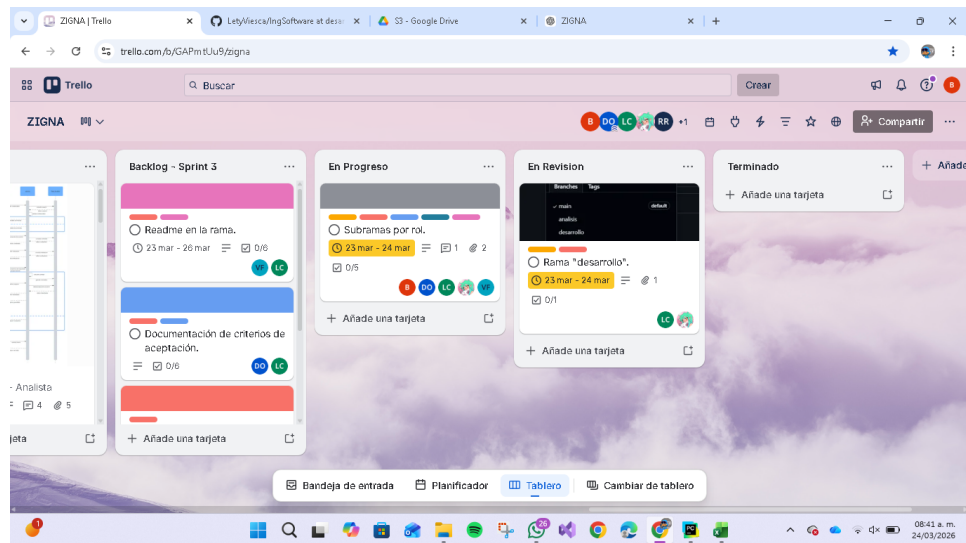


Figura 11: Avance 2026-03-24

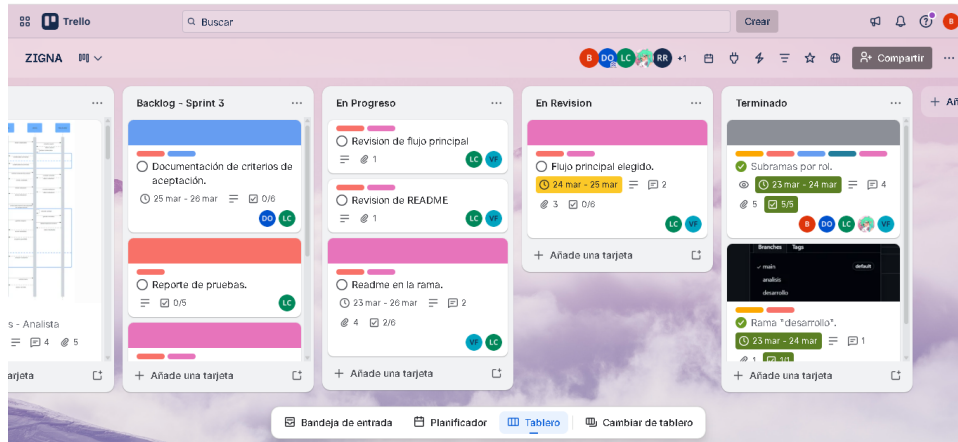


Figura 12: Avance 2026-03-25

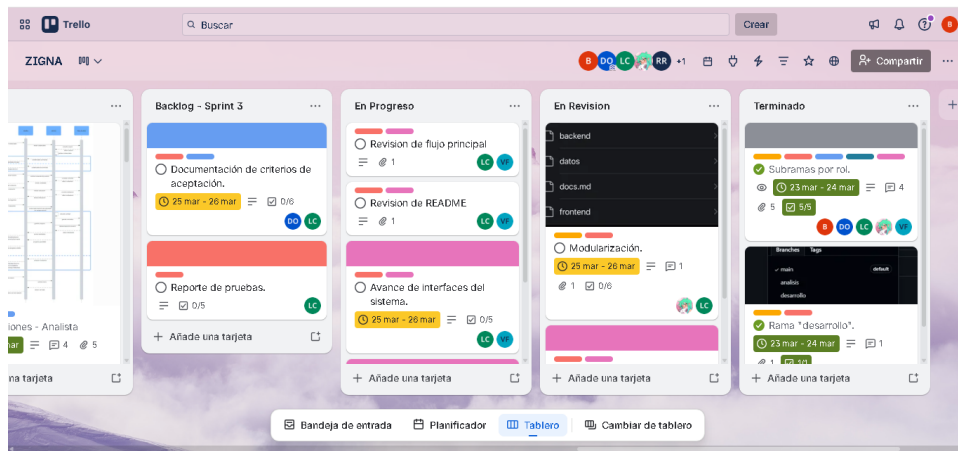


Figura 13: Avance 2026-03-26

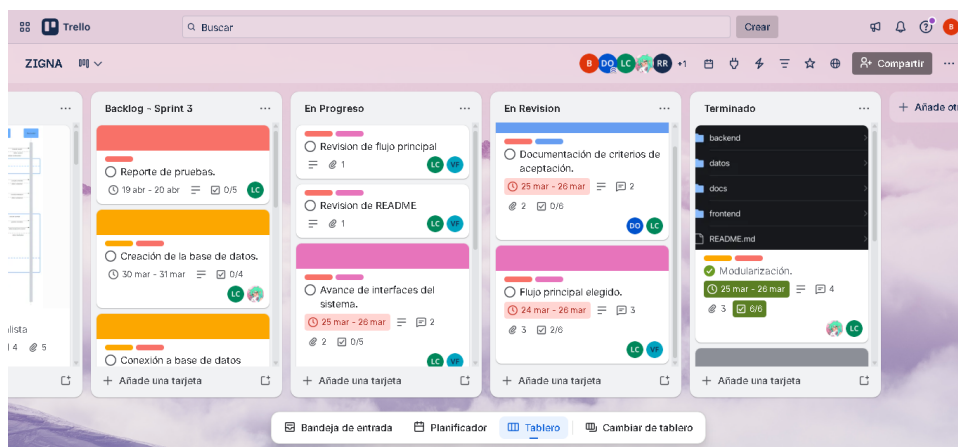


Figura 14: Avance 2026-03-30

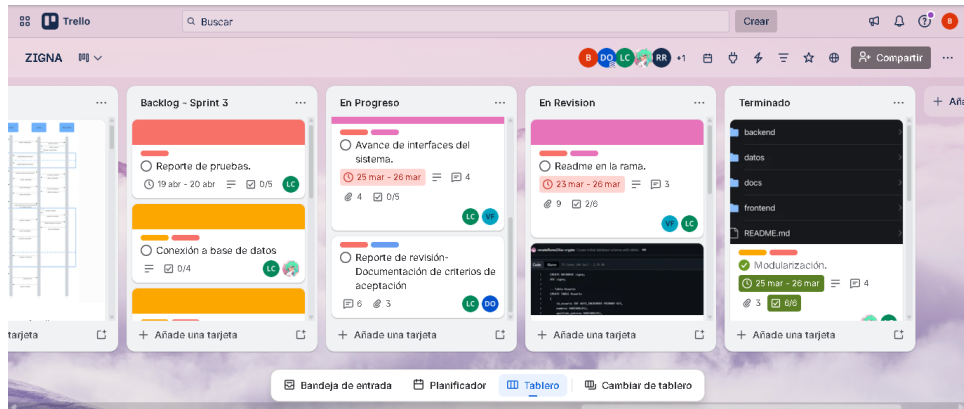


Figura 15: Avance 2026-04-01

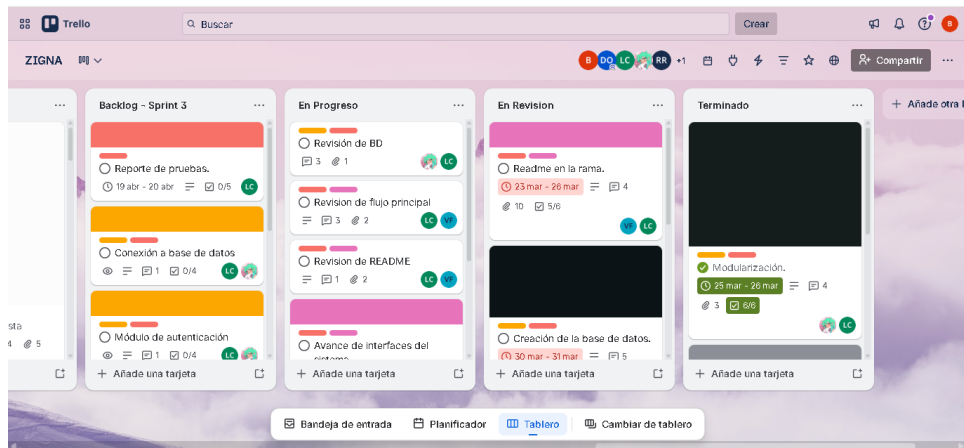


Figura 16: Avance 2026-04-14

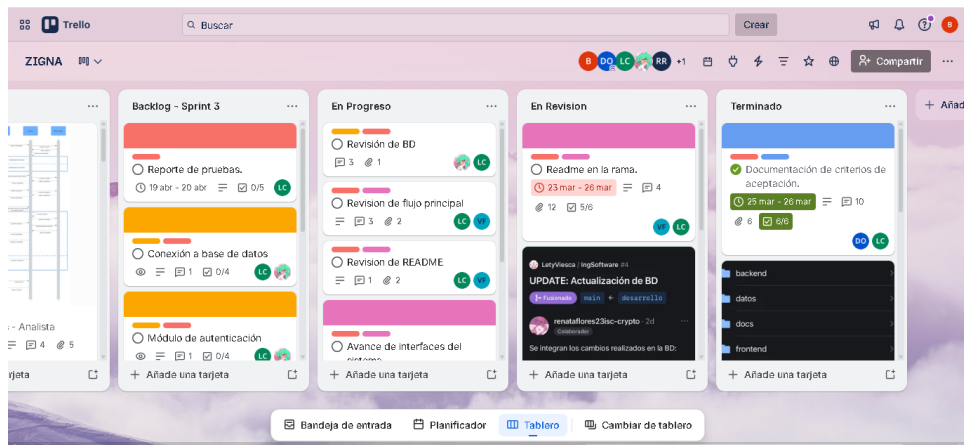


Figura 17: Avance 2026-04-16

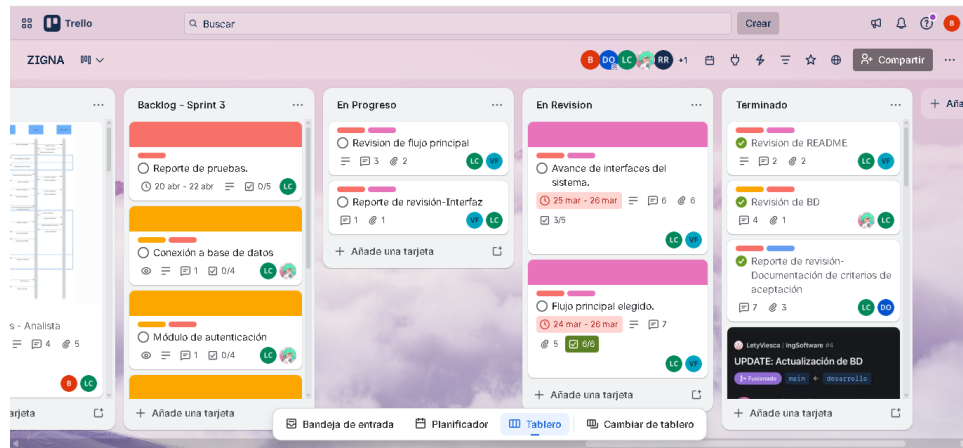


Figura 18: Avance 2026-04-20

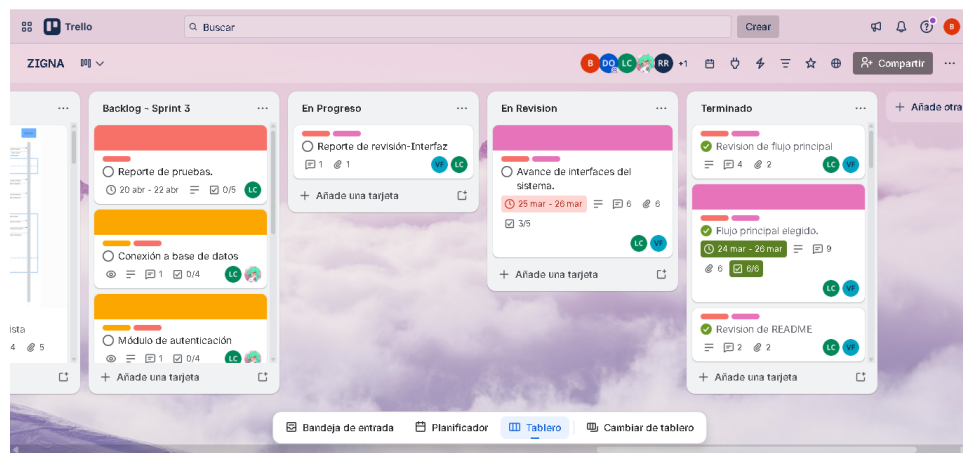


Figura 19: Avance 2026-04-21

11.3. GitHub

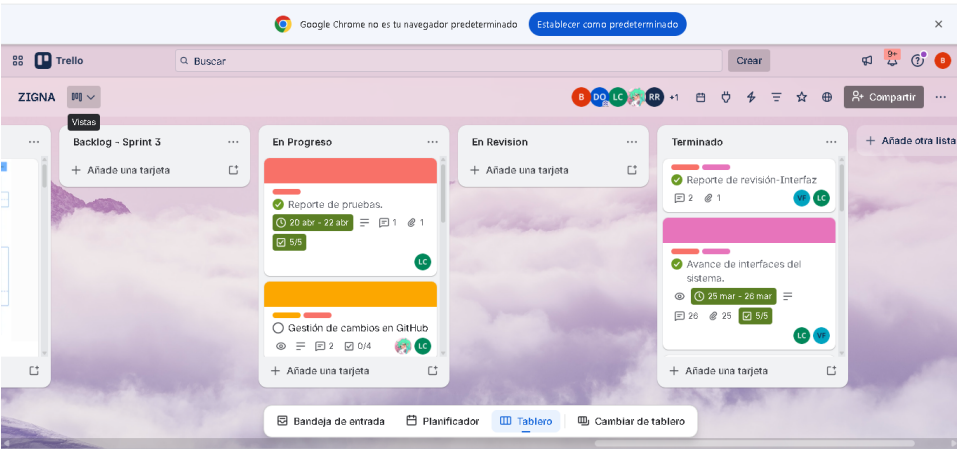


Figura 20: Avance 2026-04-23

11.4. GitHub

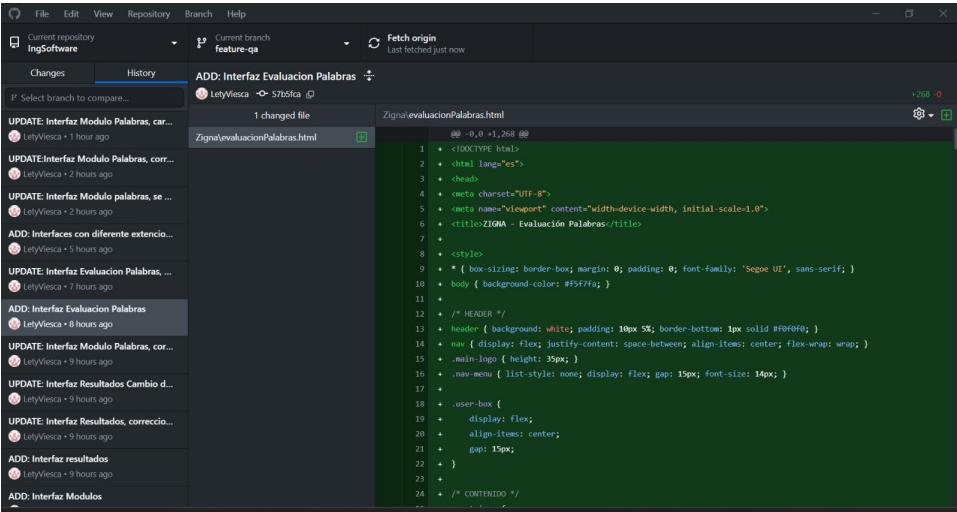


Figura 21: GitHub-QA

11.5. Visual

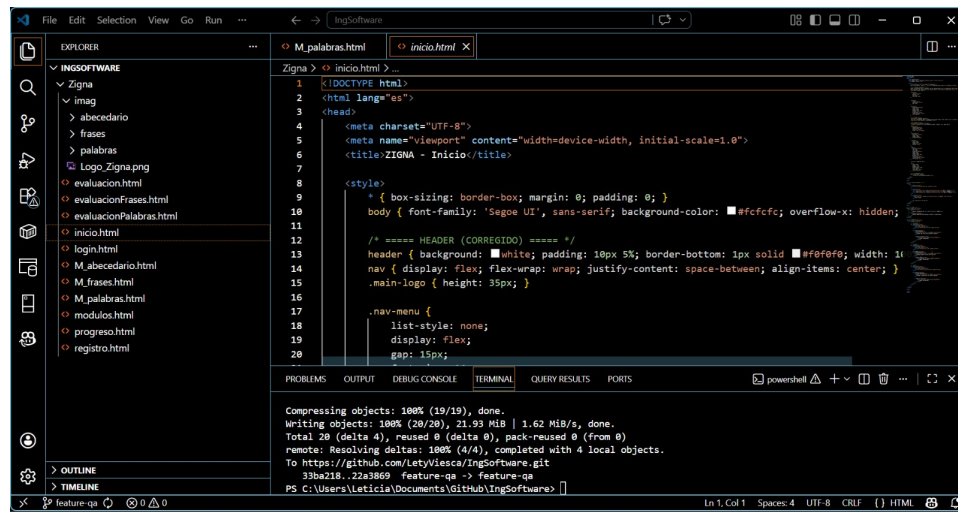


Figura 22: Visual-QA

11.6. XAMPP

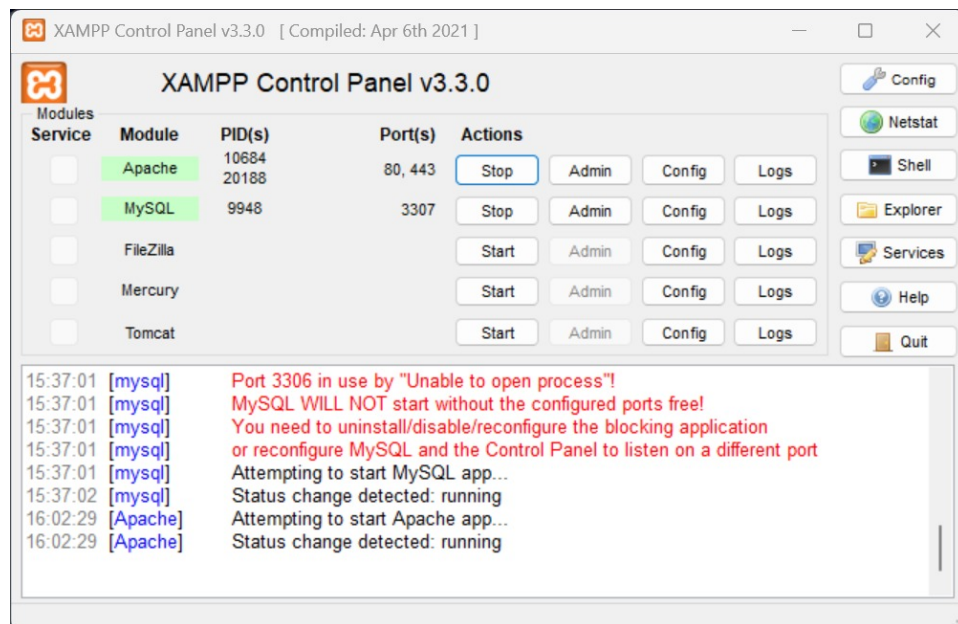


Figura 23: XAMPP-QA

Nota: Las imágenes utilizadas en las pantallas se subieron a una carpeta en OneDrive:

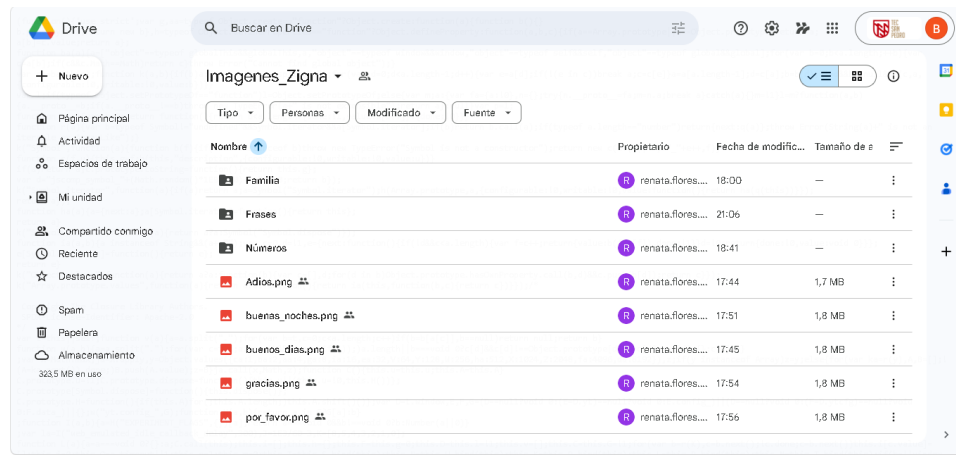


Figura 24: OneDrive
